

Aan: Wethouder Verbraak

Datum: 2 juli 2015

Betreft: Revitalisering basisschool de Linde verhuizing kinderen

Bij het raadsvoorstel tot renovatie van basisschool de Linde is vermeld:

"Om het onderwijs zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van de werkzaamheden, wordt ervoor gekozen de werkzaamheden in de schoolvakanties te laten plaatsvinden. In de zomervakantie 2014 wordt gestart met de eerste werkzaamheden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2015 gereed."

Nu is ons ter ore gekomen dat bij aanvang van het nieuwe schooljaar de hele school ontruimd wordt voor een periode van 8 weken (Mits de bouwwerkzaamheden niet uitlopen, anders langer), waarbij de bovenbouw elke dag met bussen naar Roosendaal vervoerd gaat worden, en de onderbouw in dorpshuis Nisipa wordt ondergebracht.

We horen dat dit alles is/wordt geregeld op verzoek van, en in nauwe samenspraak met de ouders, want deze zagen de veiligheid van hun kinderen in het gedrang komen. Ook dorpshuis Nisipa faciliteert in onderdak voor de onderbouw.

Dit is een grote wijziging van hetgeen in het raadsvoorstel is beschreven qua veiligheid en lesklimaat. De gemeenteraad blijft bij zulke wijzigingen op een raadsbesluit graag vooraf op de hoogte. De fractie van de Roosendaals Lijst ontvangt daarom graag van de wethouder zo snel mogelijk een update rondom deze veranderingen, waarin alle wijzigingen worden benoemd, en waarin speciale aandacht wordt gegeven aan de volgende aspecten:

- Waarom een verandering van inzicht qua gebruik tijdelijke ruimtes?
- Hoe is de veiligheid rondom het vervoer geregeld bijvoorbeeld m.b.t. de verzamel- en opstapplaats, verkeersbrigadiers, uitstapplaats?
- Bij de commissiebehandeling is gesteld dat bijhuren van ruimte niet was opgenomen in de begroting en kostenverhogend zou zijn. Waaruit worden de extra kosten voor huur van ruimtes en dagelijks vervoer betaald?
- Hoe komt het dat er nu zo lang tijdens schooltijd moet worden verbouwd? Waarom is er vorige schoolvakanties niet meer uitgevoerd?
- Gaat het om 8 weken of is verdere uitloop mogelijk?
- Hoe zit het met de inspanningen om plaatselijke ondernemers te betrekken? Graag een overzicht welke acties hierin ondernomen zijn en met welke resultaten!

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,
Charl Goossens
Cor Gabriëls


Wij beantwoorden de vragen als volgt:

1. Aanvankelijk was er sprake van een gefaseerde renovatie, waardoor het gebruik van tijdelijke ruimtes niet noodzakelijk was. Gefaseerde renovatie bleek na de voorlopige ontwerpfase niet langer mogelijk, met name als gevolg van de noodzakelijke asbestsanering. Veiligheid en gezondheid van de kinderen en leerkrachten zijn voor het schoolbestuur leidend in alle besluiten die worden genomen in relatie tot de renovatie.
1. KPO stelt veiligheid te allen tijde voorop (zie vorig antwoord) en is een leidend criterium voor het maken van afspraken omtrent vervoer.
2. KPO heeft aangegeven deze kosten te bekostigen vanuit het beschikbaar gestelde renovatiebudget.
3. Tijdens de vorige schoolvakanties zijn er voorbereidingen getroffen en zijn alle mogelijke werkzaamheden uitgevoerd. Door de renovatie in 1 fase uit te voeren wordt de bouwtijd tijdens schooltijd verkort en de renovatiedoorlooptijd teruggebracht. De duur van de renovatie tijdens en na de schoolvakantie heeft te maken met de noodzakelijke asbestsanering (zie vraag 1).
4. KPO rondt de werkzaamheden af voor de herfstvakantie.
5. Binnen de aanbestedingsrichtlijnen van de gemeente Roosendaal zijn de werkzaamheden aanbesteed. De "winnende" hoofdaannemers hebben de nadrukkelijke opdracht om zoveel mogelijk regionale en lokale onderaannemers in te zetten. Uiteraard vanuit een bedrijfsmatige prijs/kwaliteit afweging.

Tot slot: bijgevoegd is de brief die alle ouders en betrokkenen hebben ontvangen op 15 juni jl. De informatieavond op 23 juni voor de ouders en betrokkenen leidde tot louter positieve reactie, omdat veiligheid, gezondheid en onderwijskwaliteit leidend is. Er is afstemming tussen KPO Roosendaal, directie, werkgroep renovatie, MR en bewonersplatform Nispen.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
Namens dezen,

Hans Verbraak,
Wethouder onderwijs

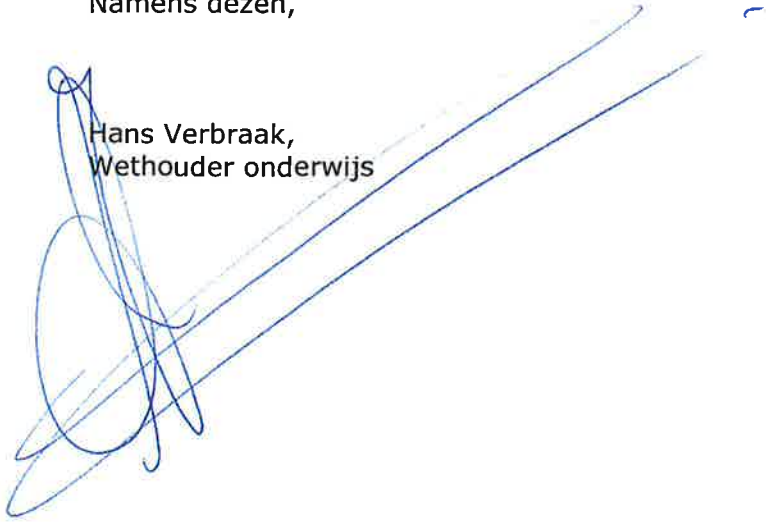

Beste ouders / verzorgers,

De start van de renovatie van onze school is in zicht. Met deze brief informeren we jullie over de voortgang van deze renovatie en het proces wat tot op heden heeft plaats gevonden.

Tijdens de informatieavond op 3 maart jl. hebben we met elkaar gesproken over de renovatie. We hebben aangegeven dat ons doel was om de school niet te sluiten tijdens de renovatie. Op dat moment gingen we ervan uit dat de renovatie, inclusief asbestsanering, gefaseerd zou plaats vinden. Doordat de renovatie in stappen plaats zou vinden, konden de kinderen tijdens de werkzaamheden op school blijven. Tijdens de informatieavond hebben veel ouders hun zorg uitgesproken over de onrust en overlast die kan ontstaan tijdens zo'n renovatie. Ook wij vinden uiteraard dat de kinderen zo min mogelijk last hiervan mogen ondervinden.

Op die avond stond de aanbesteding van de renovatie nog open. Inmiddels is dit achter de rug en zijn de aannemers bekend. Dat zijn Aannemersbedrijf Heerkens van Bavel en Van Dorp Installaties. Met deze aannemer en installateur hebben we uitvoerig over het plan van aanpak gesproken. De aannemer heeft ons geadviseerd om de kinderen tijdens de renovatie niet op school te laten verblijven. Dit in verband met de veiligheid en de gezondheid van de kinderen. Ook op de kwaliteit van het onderwijs heeft dit effect. Dit advies van de aannemer en de door u geuite zorgen heeft ons doen besluiten om het plan van aanpak aan te passen. De totale renovatie wordt niet meer gefaseerd uitgevoerd. Het wordt in een kortere tijd uitgevoerd waardoor dit ook eerder klaar is.

Dit betekent wel dat het niet langer verantwoord is om de kinderen tijdens de renovatie naar de school te laten gaan. Dit betreft de periode van na de zomervakantie tot de herfstvakantie, een periode van 8 weken. We zijn op zoek gegaan naar een oplossing. We hebben daarbij de mogelijkheid van de gymzaal en noodunits overwogen, echter dan verblijven de kinderen nog steeds nabij de school. Dit vinden we i.v.m. de werkzaamheden voor asbestverwijdering niet verantwoord. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een andere passende locatie waar het les geven ongehinderd door kan gaan en waar faciliteiten aanwezig zijn.

De oplossing die we nu gevonden hebben is als volgt. De leerlingen van de groepen 1 t/m 3 worden gehuisvest in Nisipa te Nispen. En de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 worden gehuisvest in KPO basisschool Het Talent, Luciadonk 65 te Roosendaal. Deze leerlingen zullen door middel van busvervoer (reistijd is ongeveer 15 minuten enkele reis) van en naar de school worden gebracht. Dit betekent dat deze kinderen gedurende die 8 weken op Het Talent overblijven. De schooltijden wijzigen niet. Voor de leerlingen, die naar Het Talent gaan, heeft dit tot gevolg, dat er door de reistijd met de bus 2 x 15 minuten minder lestijd ontstaat. Dat wordt gecompenseerd door een half uur i.p.v. één uur middagpauze. Hierdoor blijft het aantal lessen hetzelfde.

Verdere praktische informatie (vervoer, overblijven etc.) ontvangen jullie uiteraard tijdig. Ook willen we jullie en jullie kinderen vóór de zomervakantie kennis laten maken met de locatie van Het Talent. Hierover worden jullie binnenkort geïnformeerd.

Wij hopen dat jullie begrijpen dat goed onderwijs voor jullie kind in een veilige & gezonde omgeving doorslaggevend is geweest bij het nemen van dit besluit.

We begrijpen ook dat dit vragen oproept. Wij nodigen jullie dan ook van harte uit op de inloop infoavond op dinsdag 23 juni as. De koffie & thee staat op school voor jullie klaar vanaf 20.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Bestuur, directie, leerkrachten en MR van KPO basisschool De Linde
